


测试报告

单位 东方机电集团有限公司

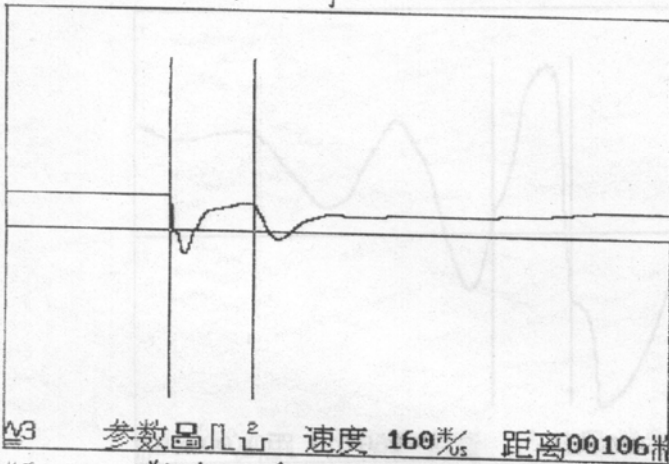

参数 品质 速度 160% 距离 00106

性质 低压塑料电缆 185mm<sup>2</sup>

标长 145m

测长 109m

故障距离

实测误差 3m

测试时间 2018.06.12-00:09

测试地点 T11-6 低压室

电缆编号 006


情况分析 此电缆为引至一年，突然穿  
 管，预埋约 80cm，此次突然发现  
 三相短路并接地故障，测其相对地  
 阻为 2Ω

测试人 苏毅



测试报告

单位 东方机电集团有限公司

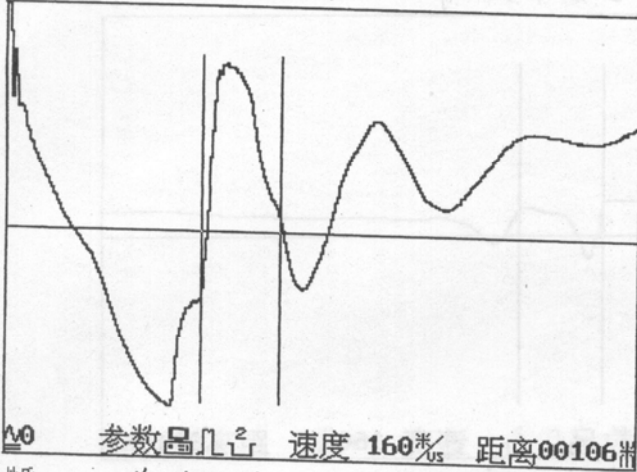

性质 低压塑料电缆 185mm<sup>2</sup>

标长 145m

测长 109m

故障距离 8M

实测误差 3m

测试时间 01.02.08 06.12-15:00

测试地点 TT-6 低压室

电缆编号 006

情况分析 此电缆运行一年，每半年  
 检修，预埋约 5cm，此次突然出况，  
 三相短路并接地故障，测其接地  
 电阻为 2Ω

测试人 苏航

